ALLEGATO "A"

Comune di Randazzo
Provincia di CT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:	Progetto per la riqualificazione dei cortili esterni e della realizzazione di un teatro interno dell_Istituto Scolastico _Edmondo De Amicis_ di Randazzo, attraverso la partecipazione al PR-FESR SICILIA 2021/2027: Priorità 5 _ Obiettivo Specifico RSO4.2. - Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all_innovazione didattica e formativa - DD. n.139 del 15/05/2024.
COMMITTENTE:	Istituto Comprensivo "E. De Amicis".
CANTIERE:	Piazza Loreto s.n.c., Randazzo (CT)

Randazzo, 26/06/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Mondello Luciano Carmelo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente Scolastico Malfitana Salvatore)

Architetto Mondello Luciano Carmelo
Via Roma n.17
95036 Randazzo (CT)
Tel.: 0957991488 - Fax: 0957991488
E-Mail: lucianomondello@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	15 g
Preparazione delle aree di cantiere	4 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g
Apprestamenti del cantiere	7 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	4 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	3 g
Impianti di servizio del cantiere	3 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm	1 g
Allestimenti per aree verdi	33 g
Accessori per aree verdi	1 g
Installazione di portabiciclette	1 g
Irrigazione aree verdi	13 g
Installazione di impianto automatico di irrigazione interra	3 g
Installazione rete di raccolta acque meteoriche	1 g
Installazione vasca di raccolta acque meteoriche	4 g
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche	5 g
Percorsi pedonali	5 g
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare	3 g
Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato	4 g
Piantumazione e posa superfici verdi	14 g
Formazione di tappeto erboso	5 g
Messa a dimora di piante	5 g
Messa a dimora di piante per fitodepurazione	5 g
Opere edili	55 g
Massetti e sottofondi	5 g
Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne	3 g
Formazione di rasatura per pavimentazioni esterne	3 g
Opere in legno e ferro	10 g
Posa di recinzioni e cancellate	3 g
Posa di ringhiere e parapetti	3 g
Verniciatura a pennello di opere in ferro	3 g
Verniciatura a pennello di opere in legno	2 g
Opere per teatri	10 g

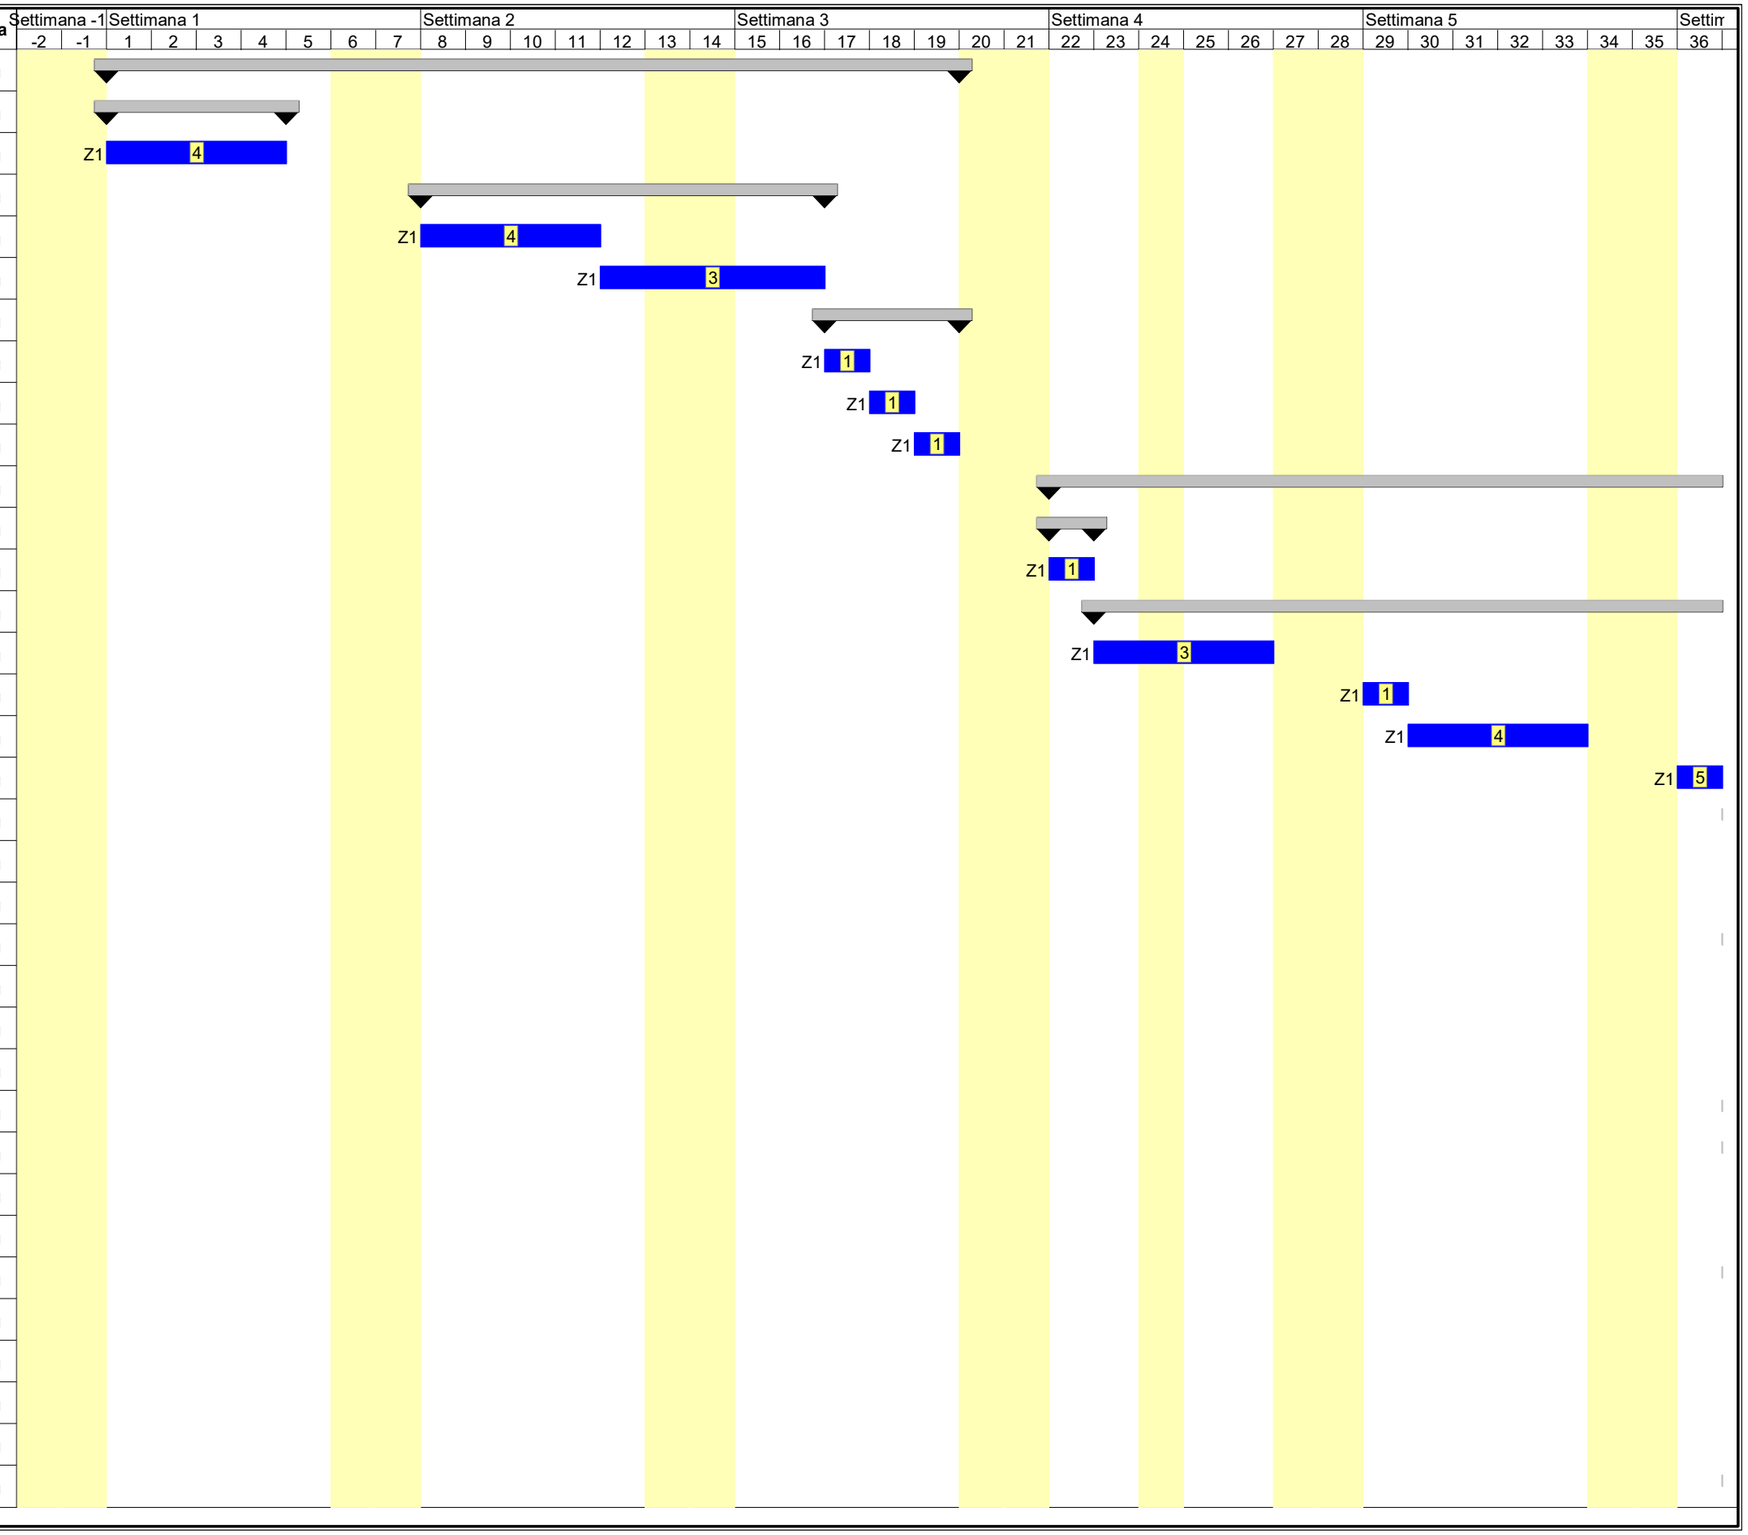

Nome attività	Durata
Posa in opera di sedute per teatro	5 g
Montaggio di travature reticolari per impianti scenici	3 g
Realizzazione di palcoscenico	2 g
Pavimentazioni esterne	22 g
Posa di pavimenti per esterni in pietra	22 g
Pavimentazioni sportive	17 g
Posa di pavimentazione antitrauma per esterni	14 g
Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi	10 g
Opere Edili interne	29 g
Intonaci interni	15 g
Applicazione di paraspigoli per interni	3 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	6 g
Rasatura di intonaci interni	5 g
Rasatura meccanizzata di intonaci interni	4 g
Massetti e sottofondi	5 g
Formazione di lisciatura per pavimenti interni	3 g
Formazione di rasatura per pavimenti interni	2 g
Pareti divisorie, controsoffittature	6 g
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	3 g
Realizzazione di tramezzature interne	3 g
Pitturazioni interne	3 g
Tinteggiatura di superfici interne	1 g
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompati	1 g
Serramenti	5 g
Montaggio di porte interne	2 g
Montaggio di serramenti interni	2 g
Posa di controtelai per serramenti interni	1 g
Impianti	14 g
Impianto elettrico	7 g
Realizzazione di impianto elettrico	4 g
Installazione di corpi illuminanti	4 g
Impianti di climatizzazione	3 g
Installazione di U.T.A.	2 g
Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione	2 g
Impiantistica teatrale	5 g

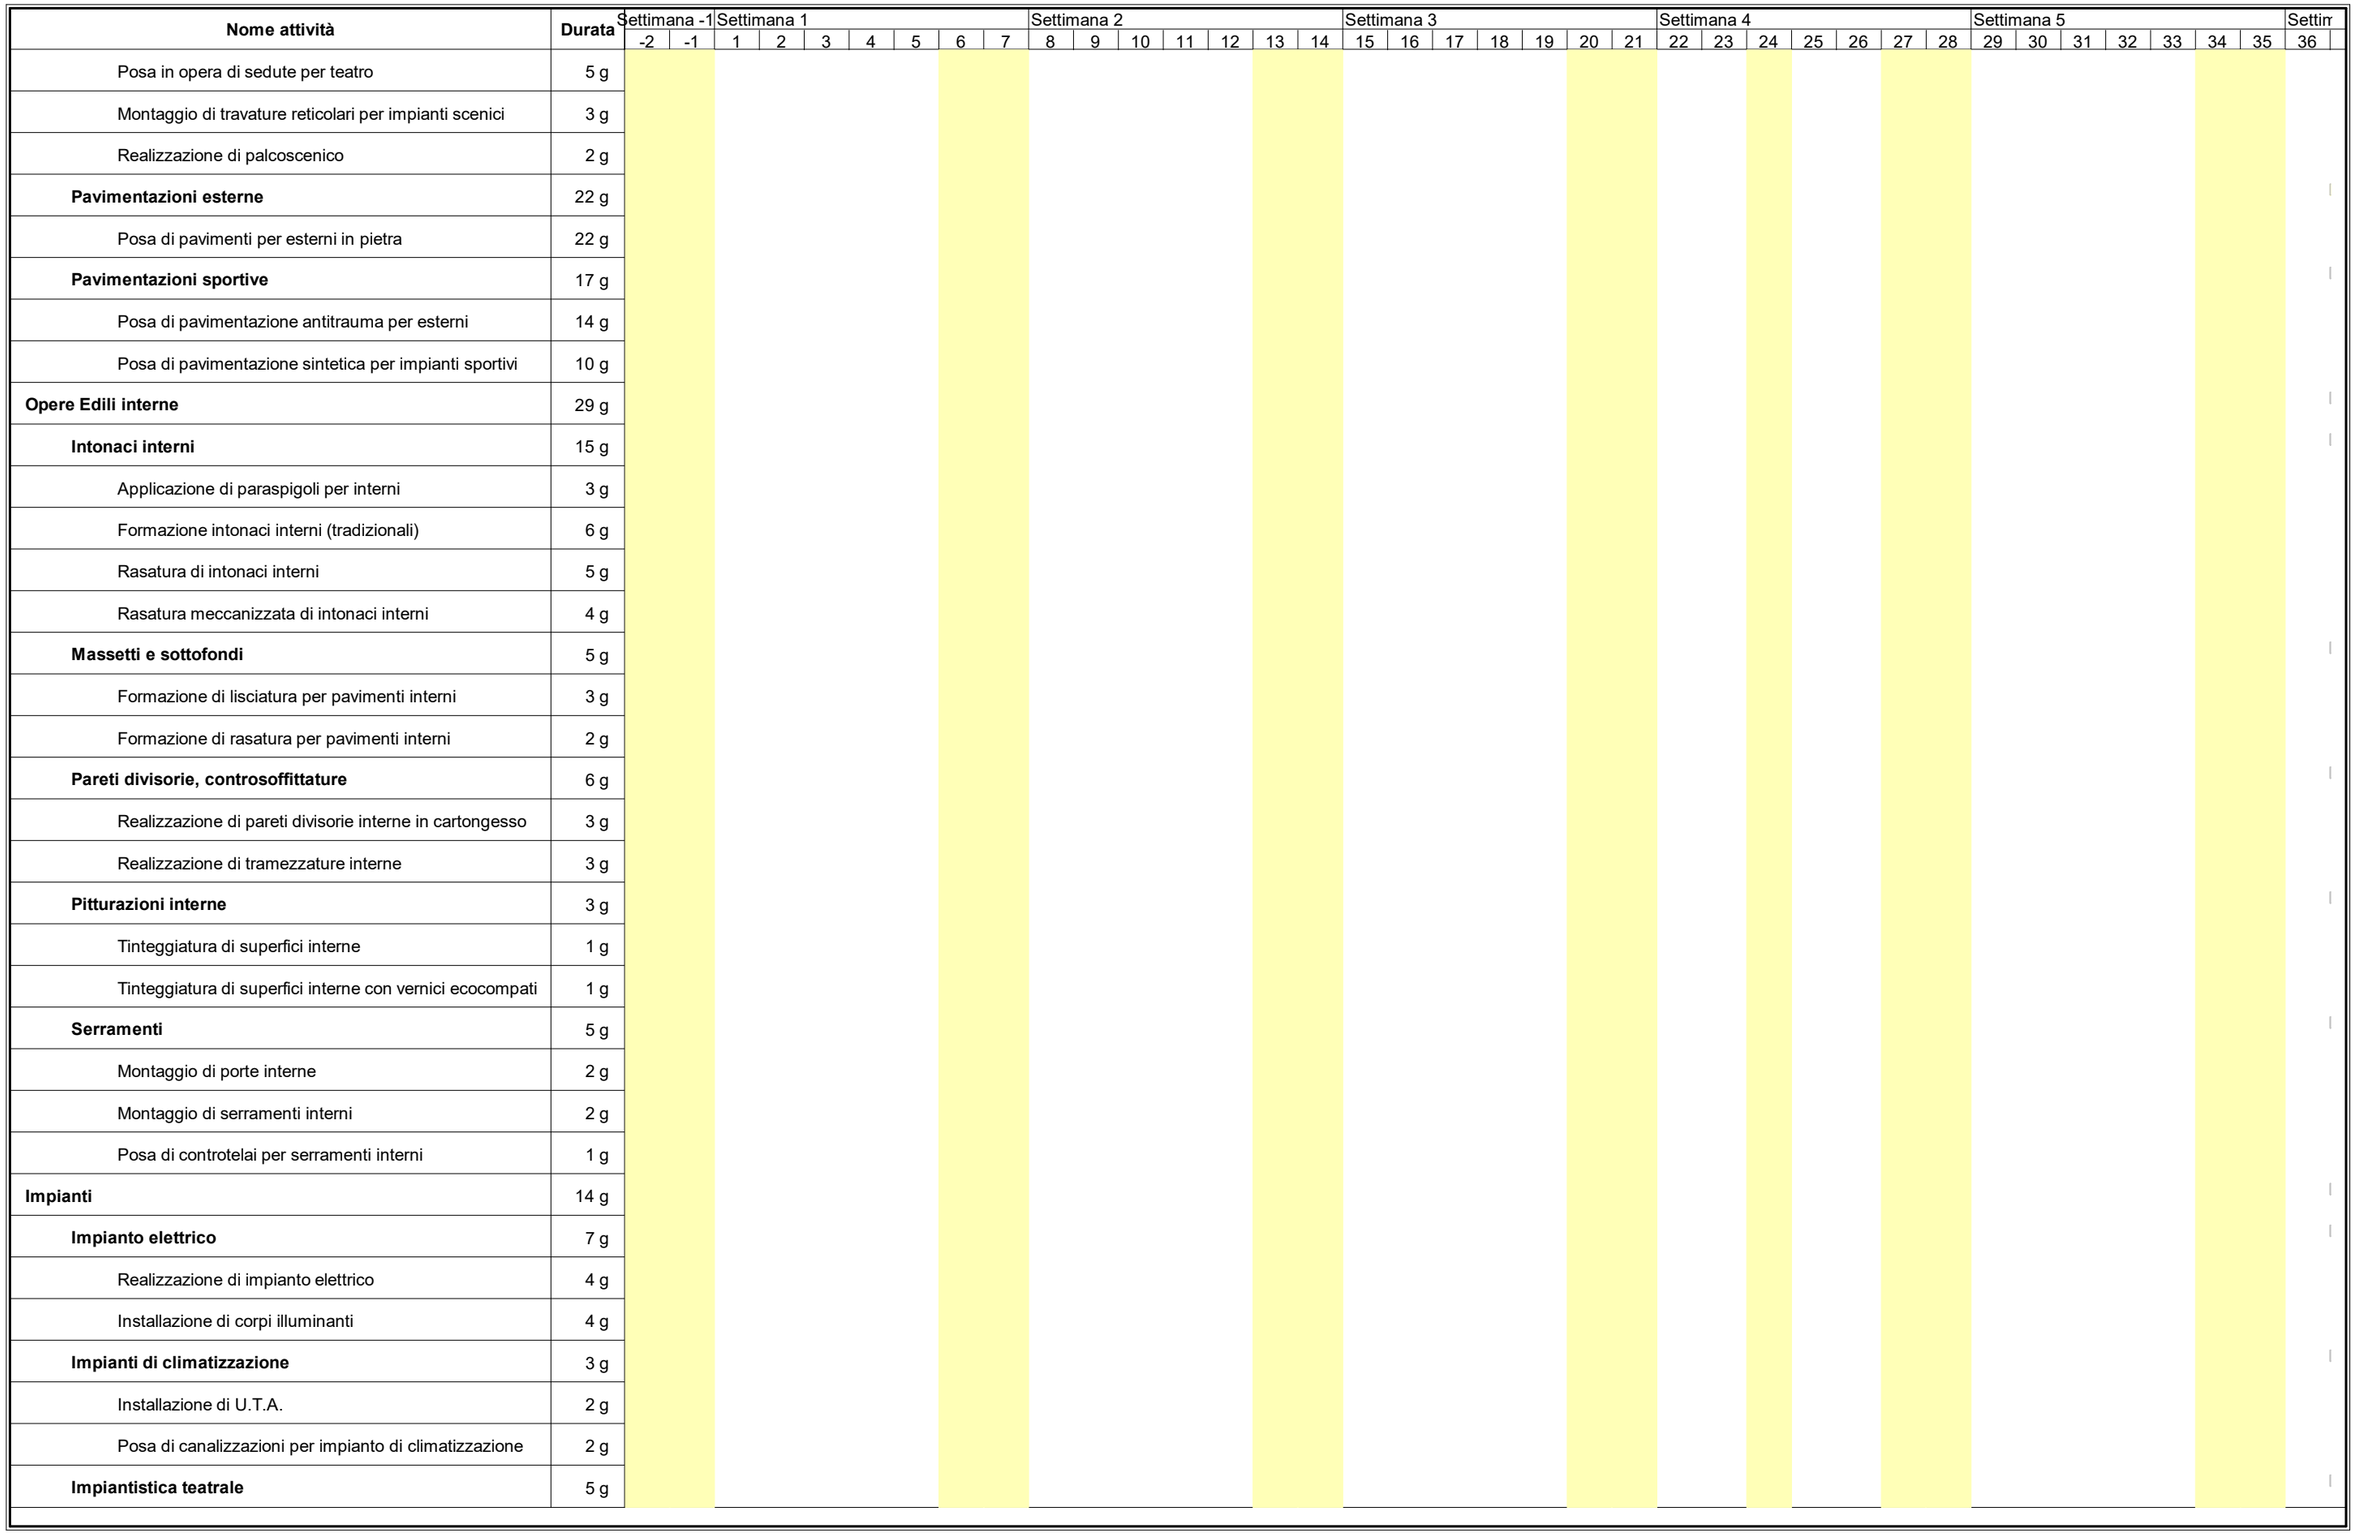

Nome attività	Durata
Installazione di impianto audio scenico	3 g
Installazione di impianto elettrico scenico	1 g
Installazione di impianto luci di scena	2 g
Smobilizzo del cantiere	12 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g
Smobilizzo del cantiere	5 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	

Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settim
-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

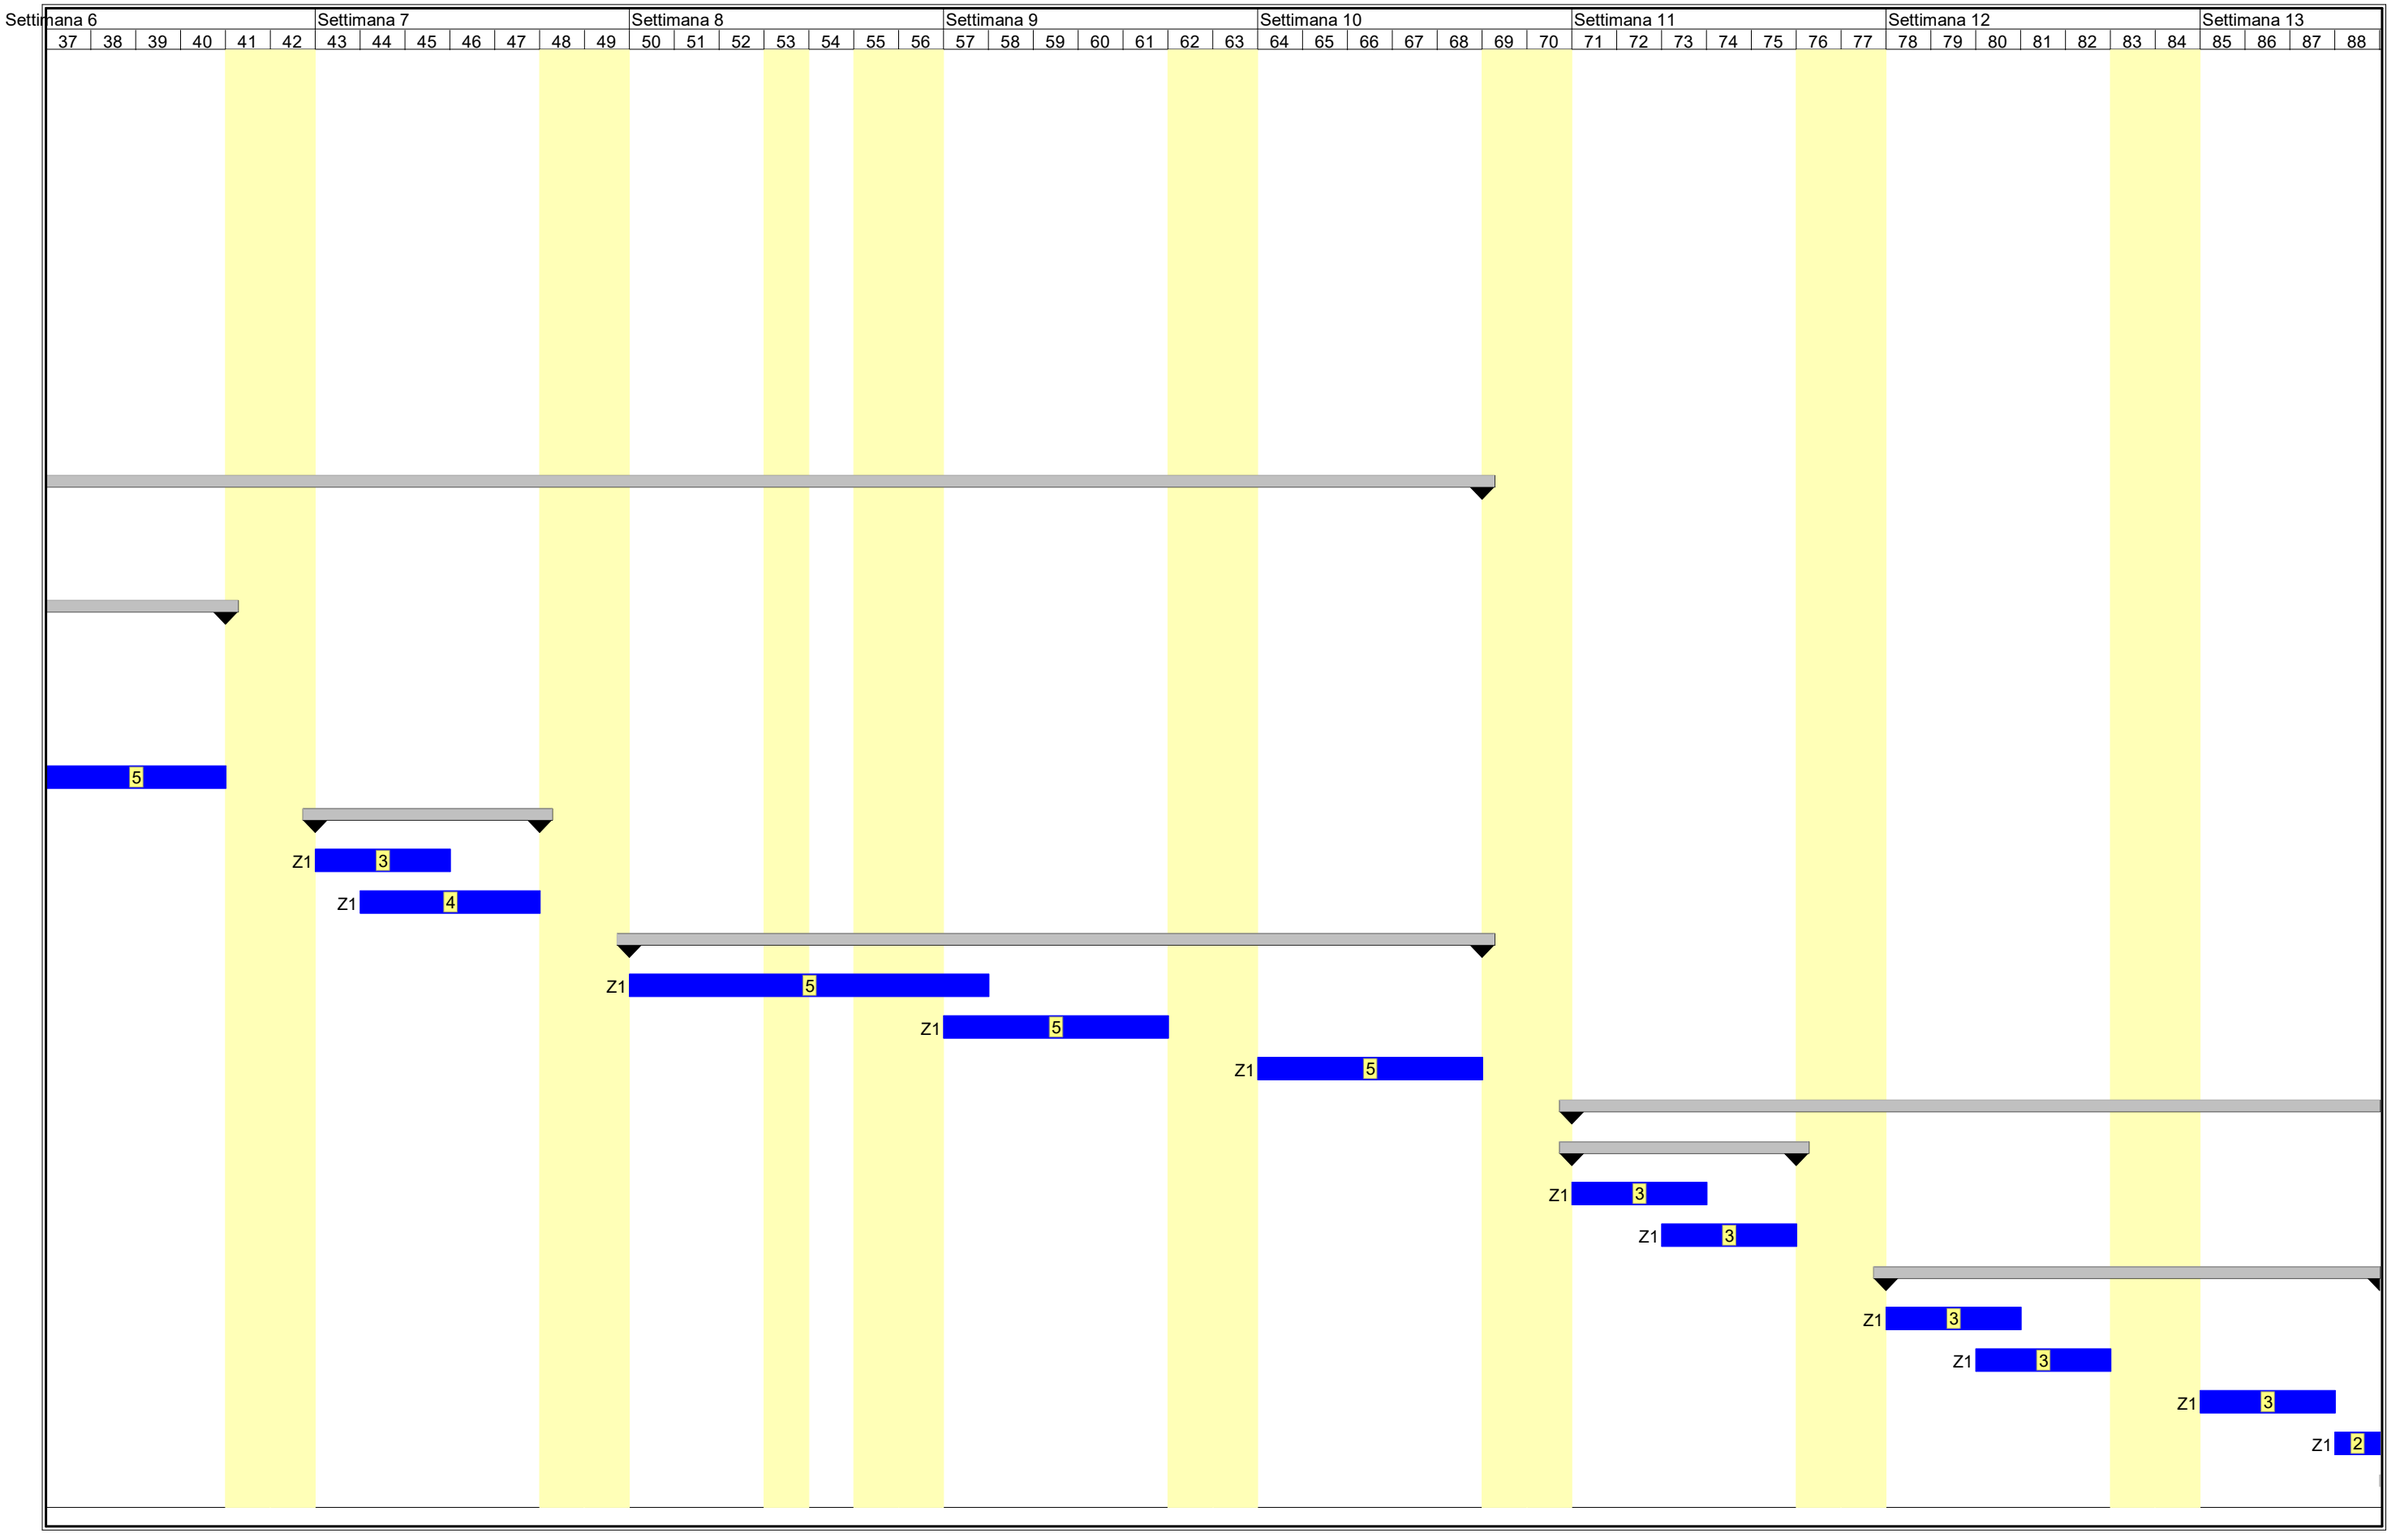
Settimana 6
Settimana 7
Settimana 8
Settimana 9
Settimana 10
Settimana 11
Settimana 12
Settimana 13
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
5
Z1 3
Z1 4
Z1 5
Z1 5
Z1 5
Z1 3
Z1 3
Z1 3
Z1 3
Z1 3
Z1 2

Settimana 6						Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settimana 11							Settimana 12							Settimana 13			
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88

Settimana 6						Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settimana 11							Settimana 12							Settimana 13			
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88

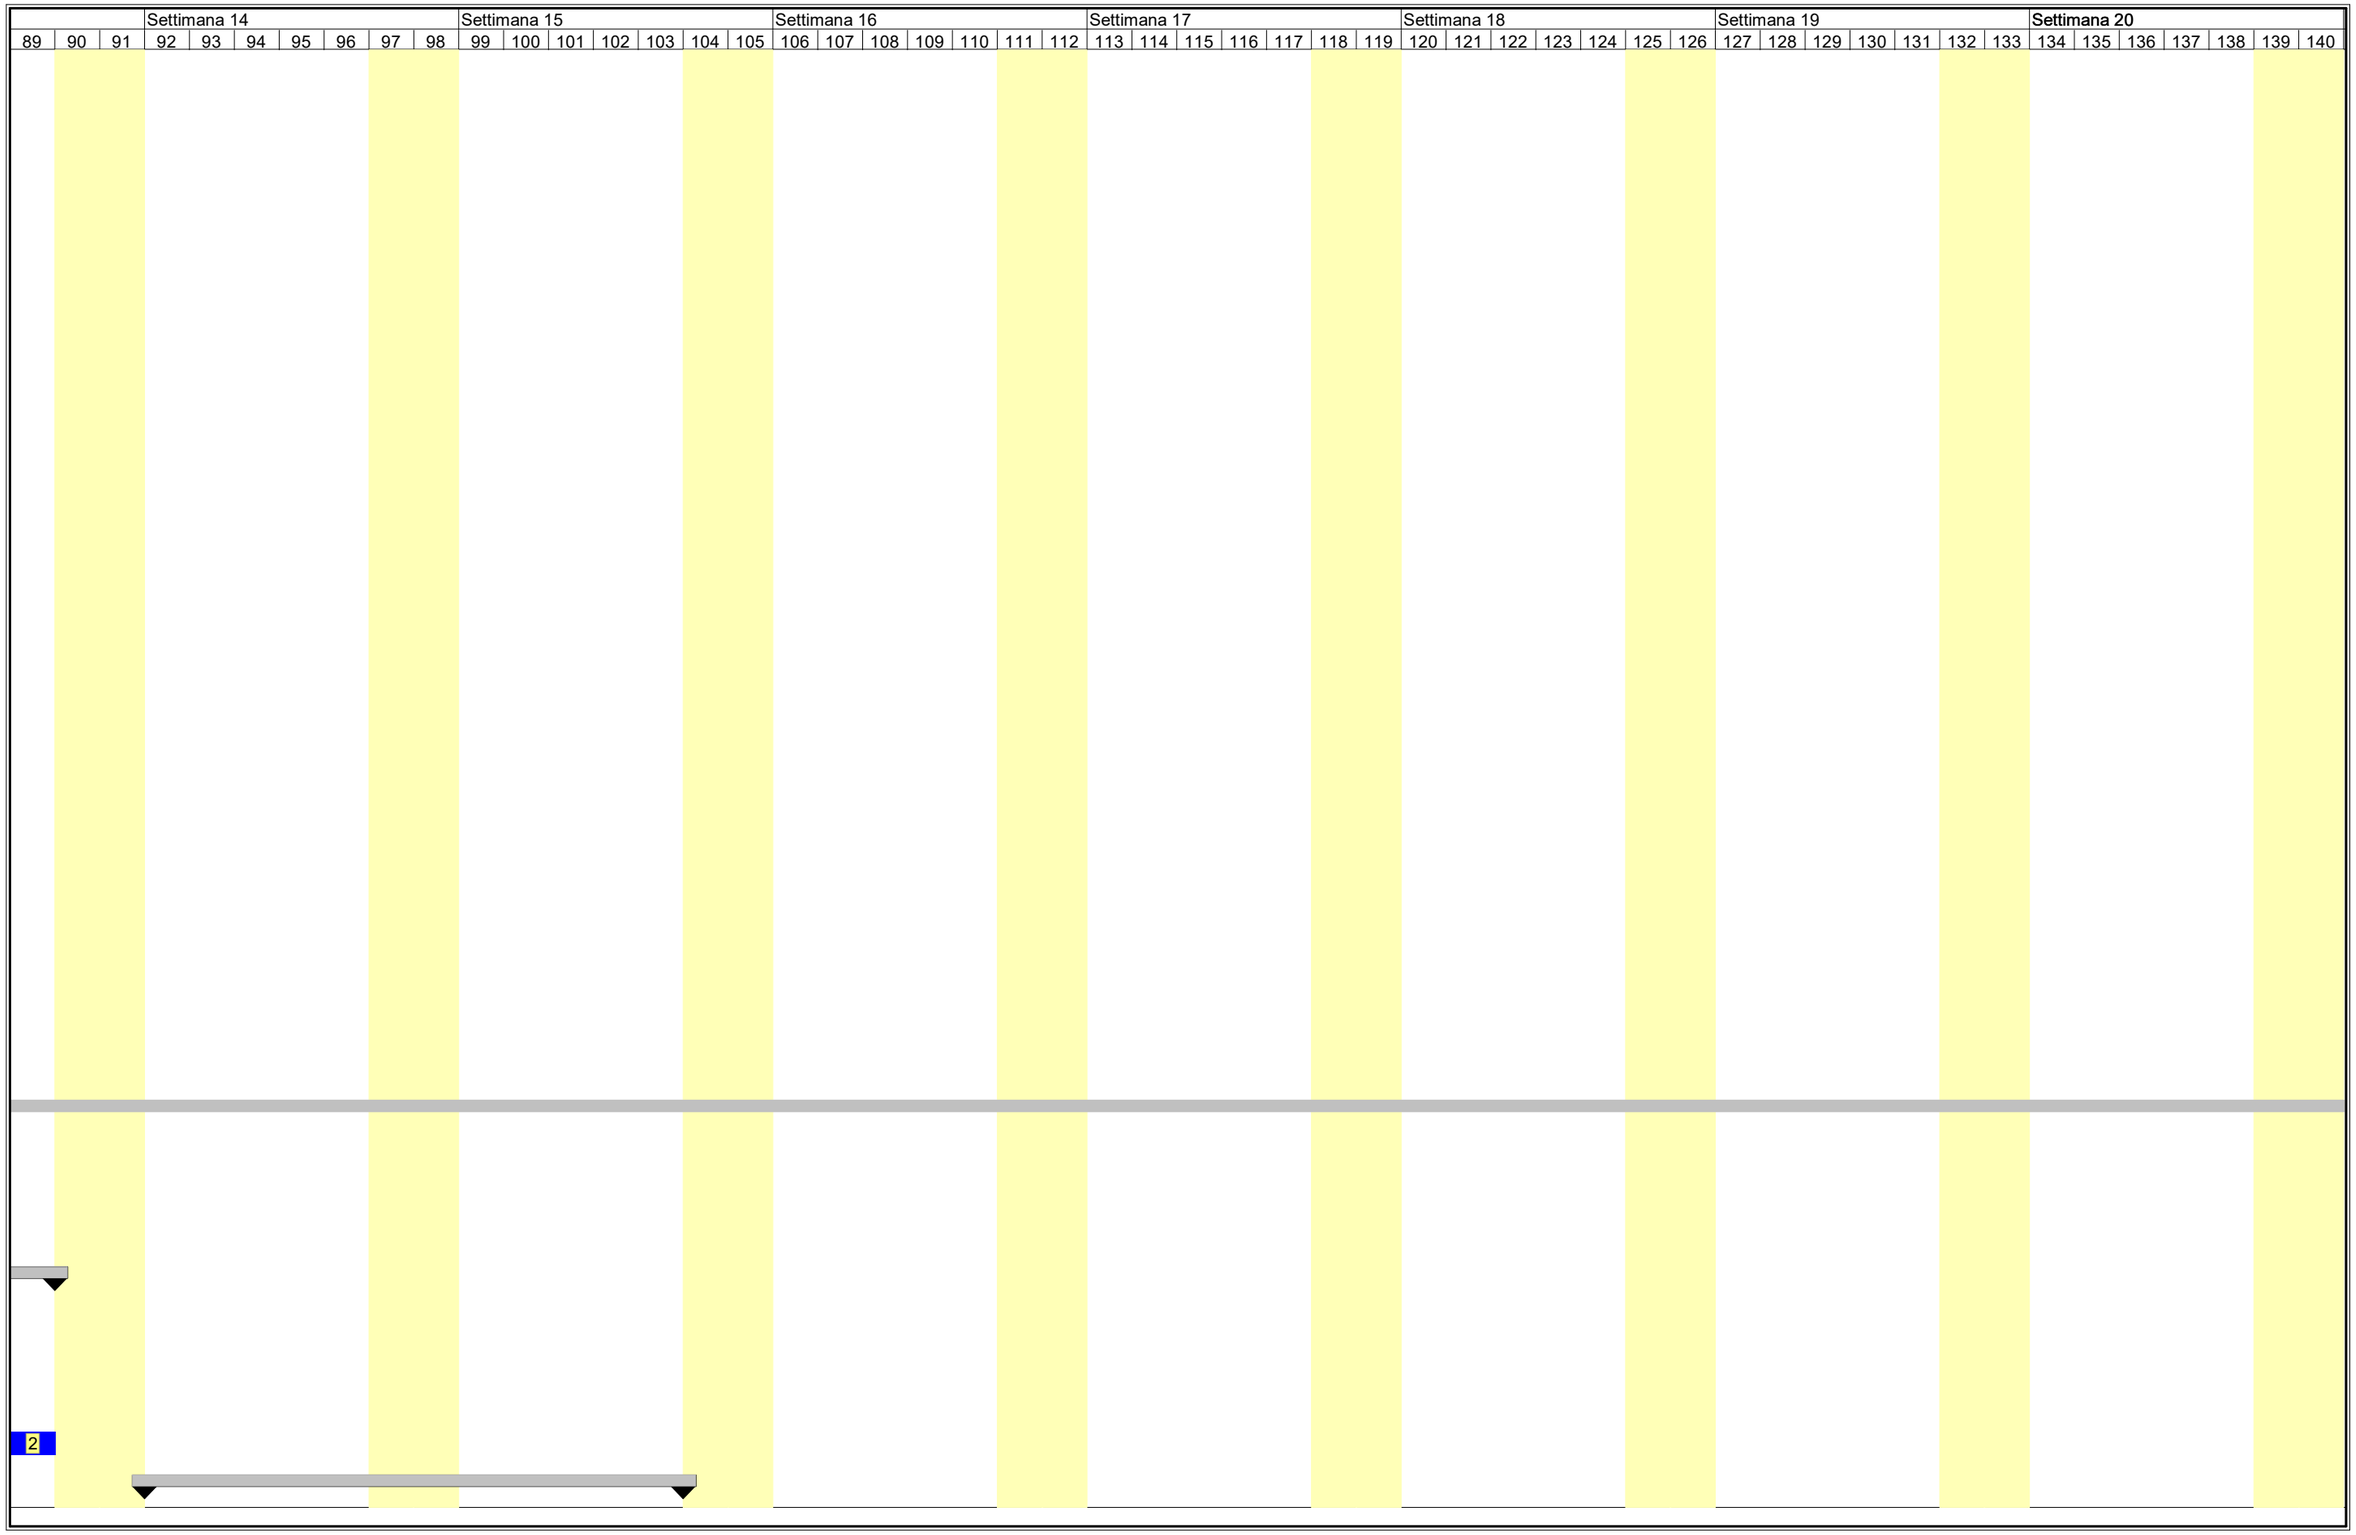
Settimana 14
Settimana 15
Settimana 16
Settimana 17
Settimana 18
Settimana 19
Settimana 20
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
2

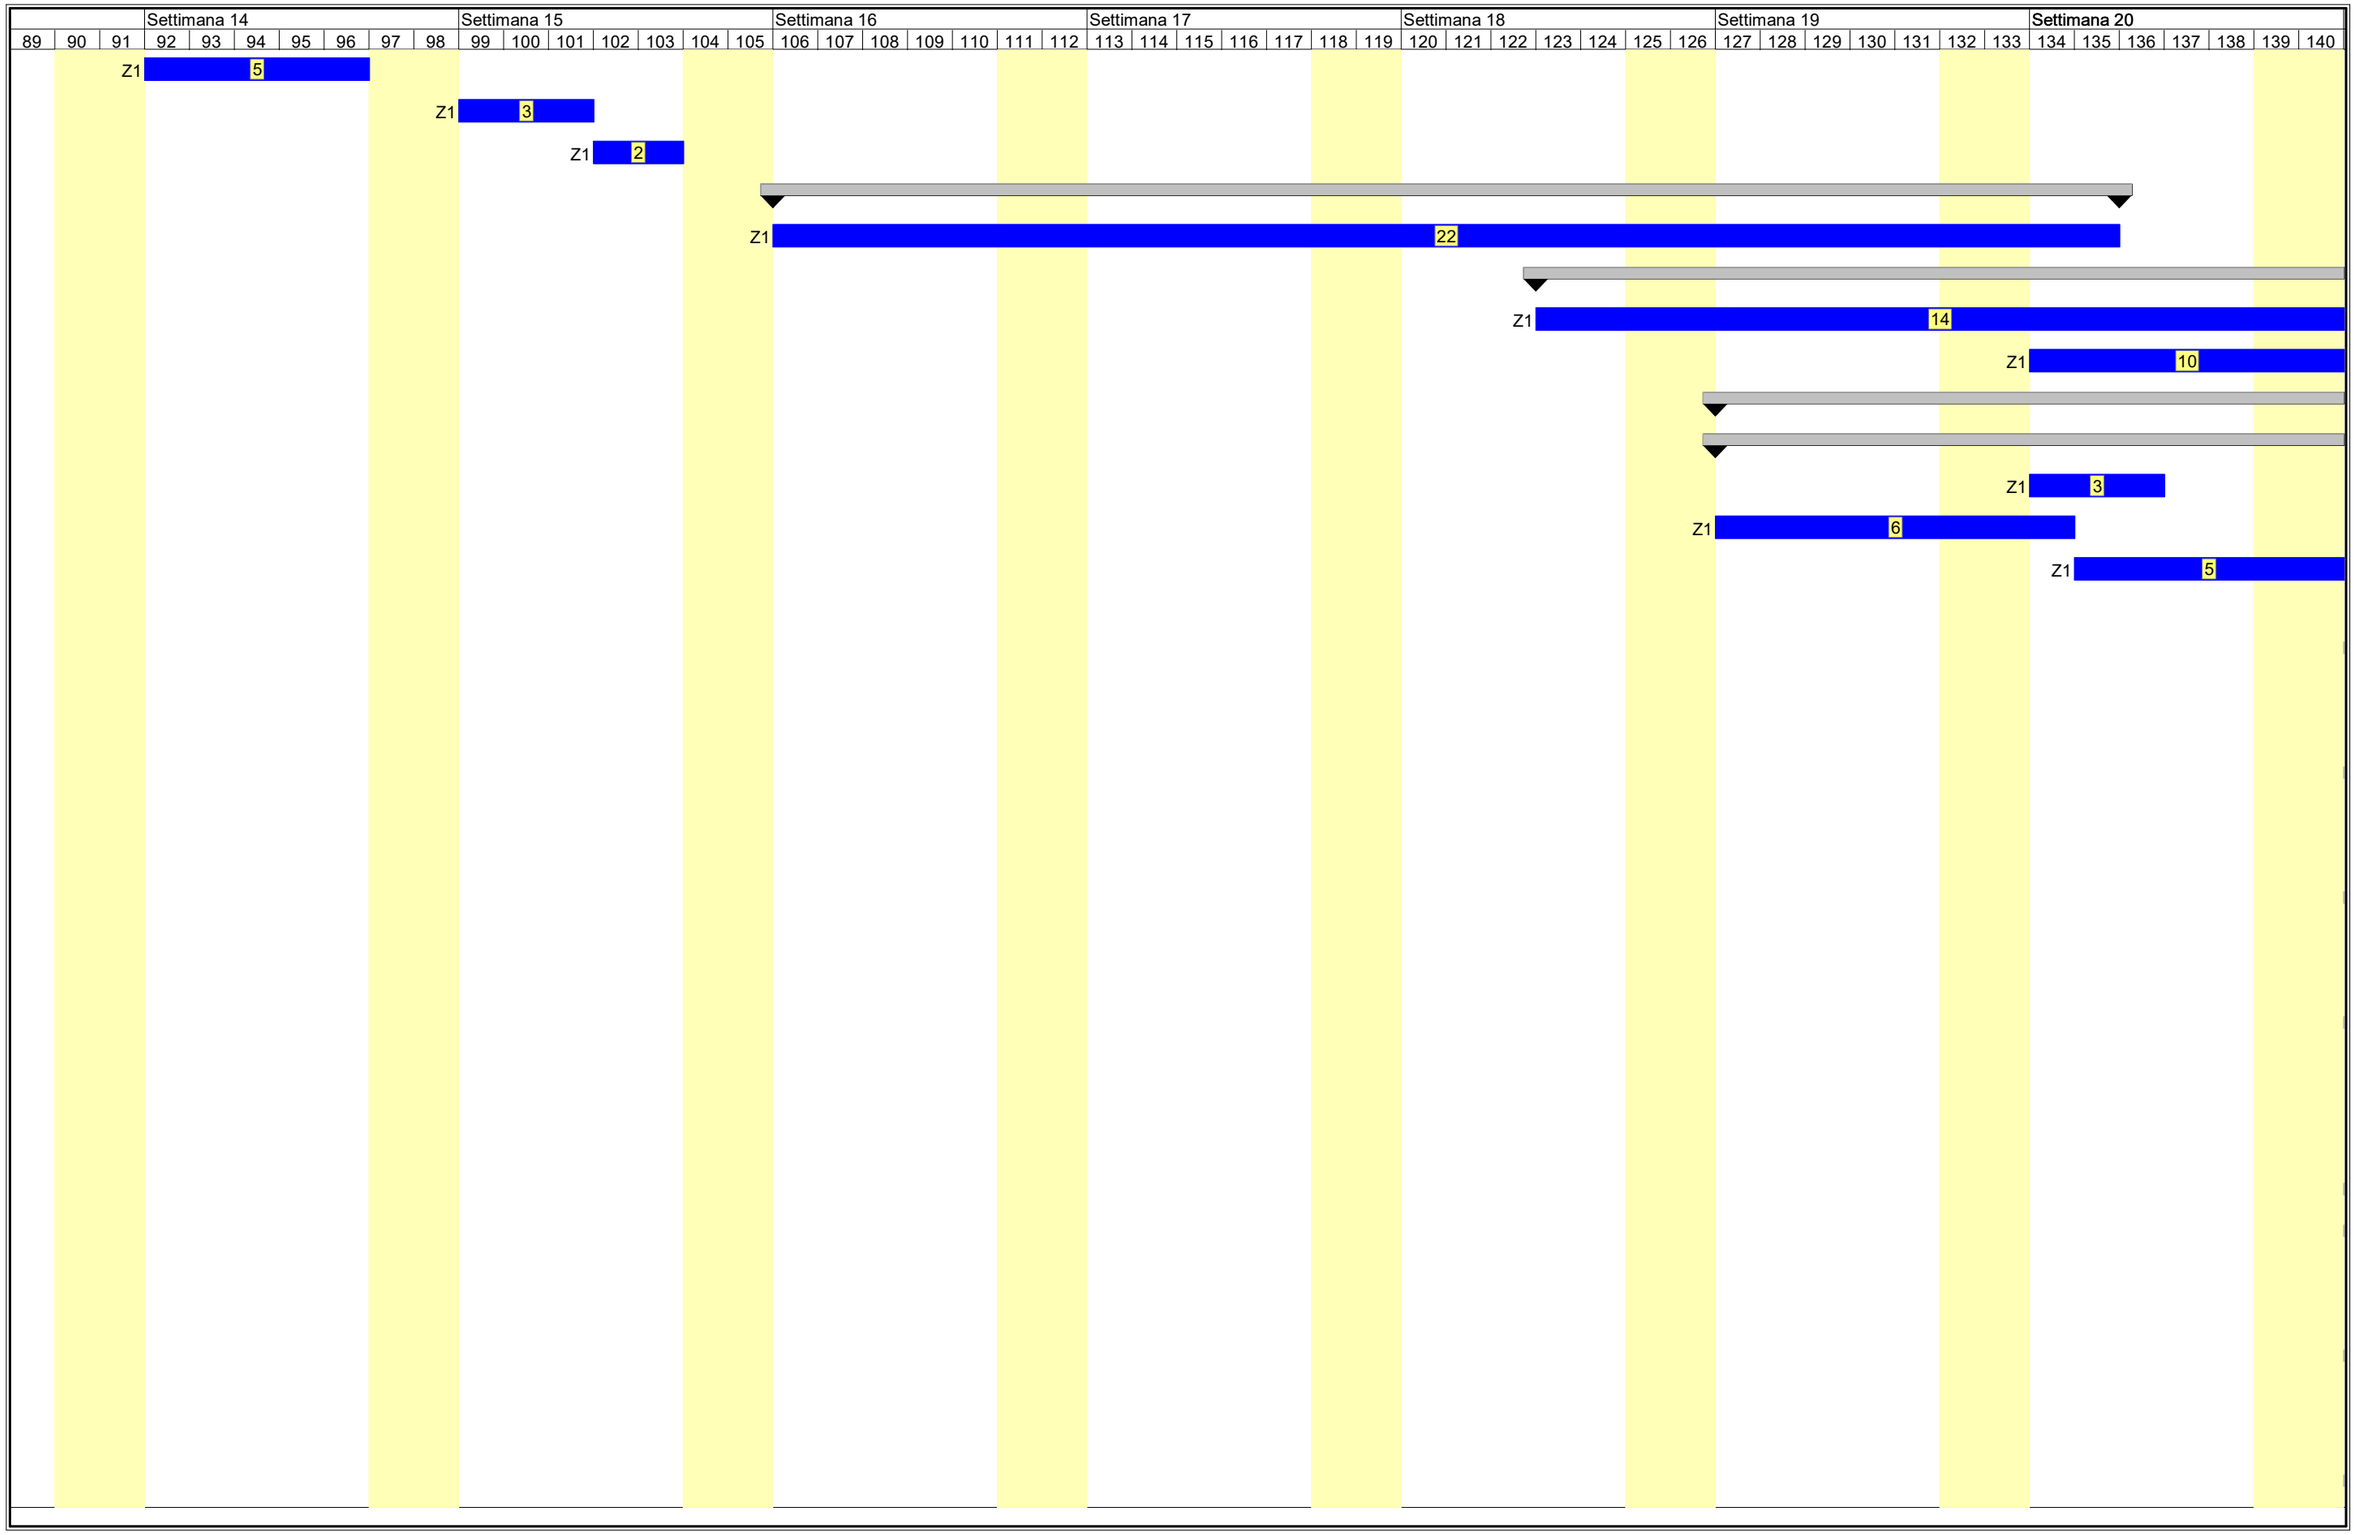
Settimana 14
Settimana 15
Settimana 16
Settimana 17
Settimana 18
Settimana 19
Settimana 20
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Z1 5
Z1 3
Z1 2
Z1 22
Z1 14
Z1 10
Z1 3
Z1 6
Z1 5

			Settimana 14						Settimana 15							Settimana 16							Settimana 17							Settimana 18							Settimana 19							Settimana 20						
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140

Settimana 21							Settimana 22							Settimana 23							Settimana 24							Settimana 25							Settimana 26							Settimana 27							Settimana 28		
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192

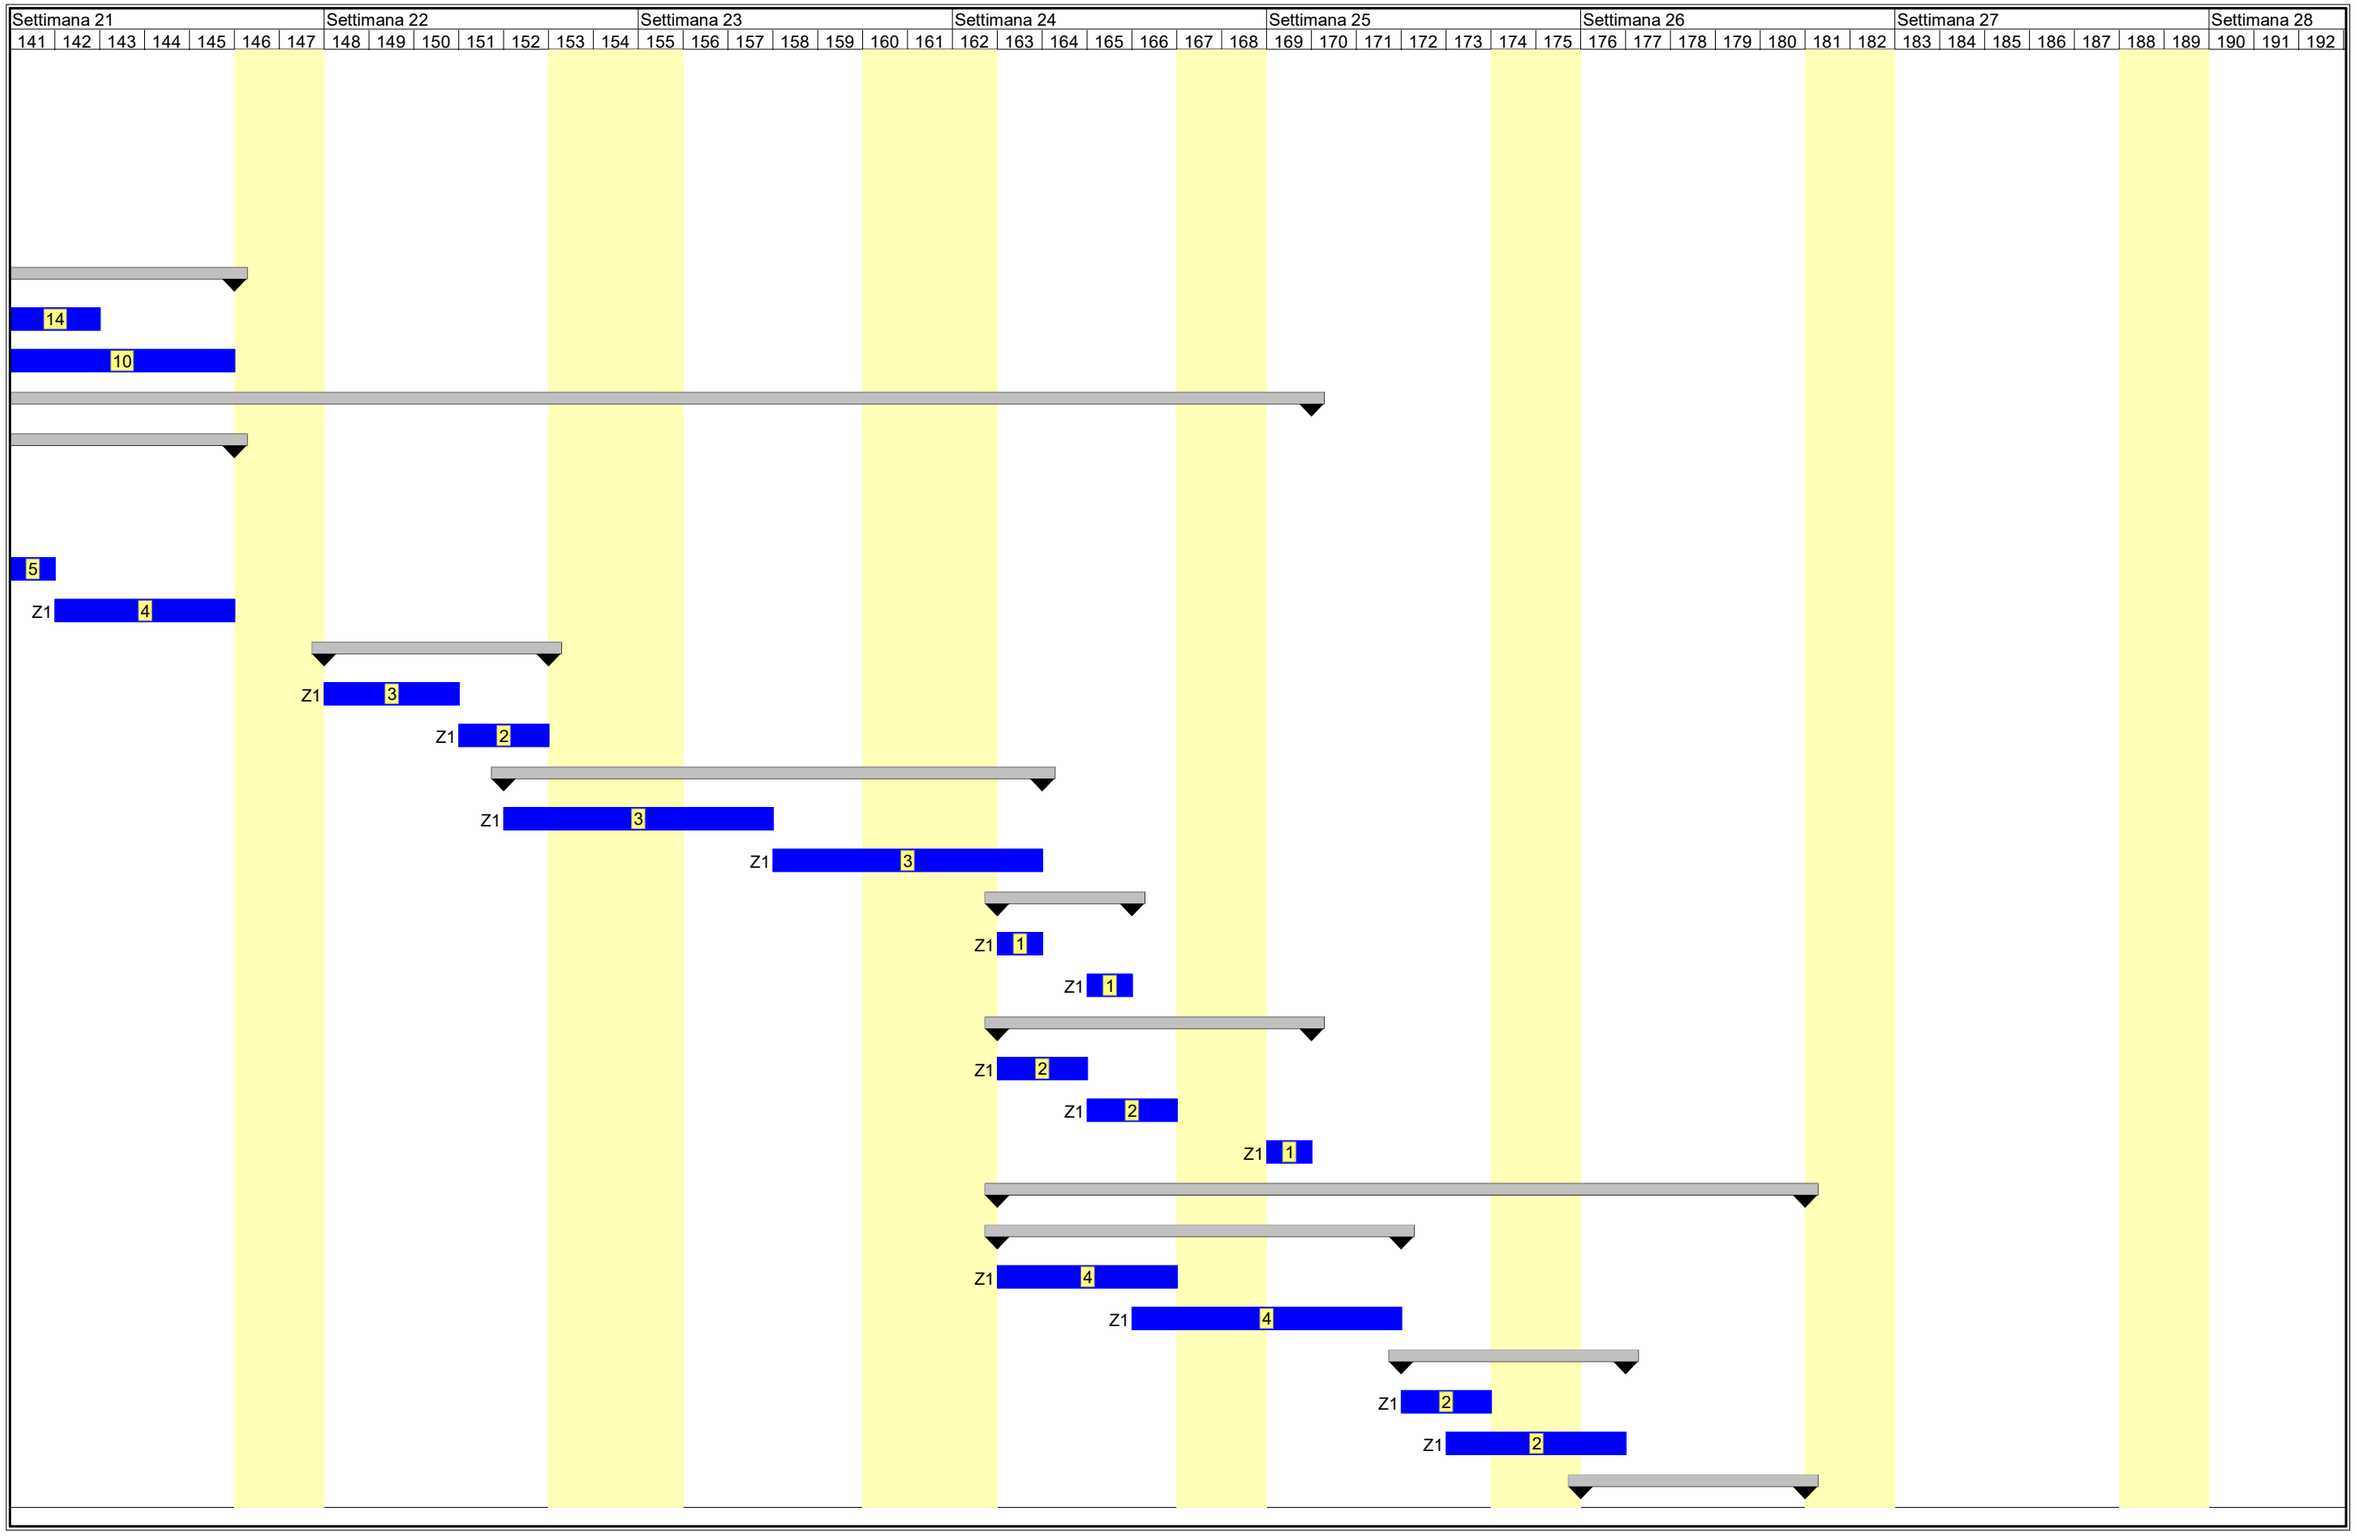
Settimana 21
Settimana 22
Settimana 23
Settimana 24
Settimana 25
Settimana 26
Settimana 27
Settimana 28
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
14
10
5
Z1 4
Z1 3
Z1 2
Z1 3
Z1 3
Z1 1
Z1 1
Z1 2
Z1 2
Z1 1
Z1 4
Z1 4
Z1 2
Z1 2

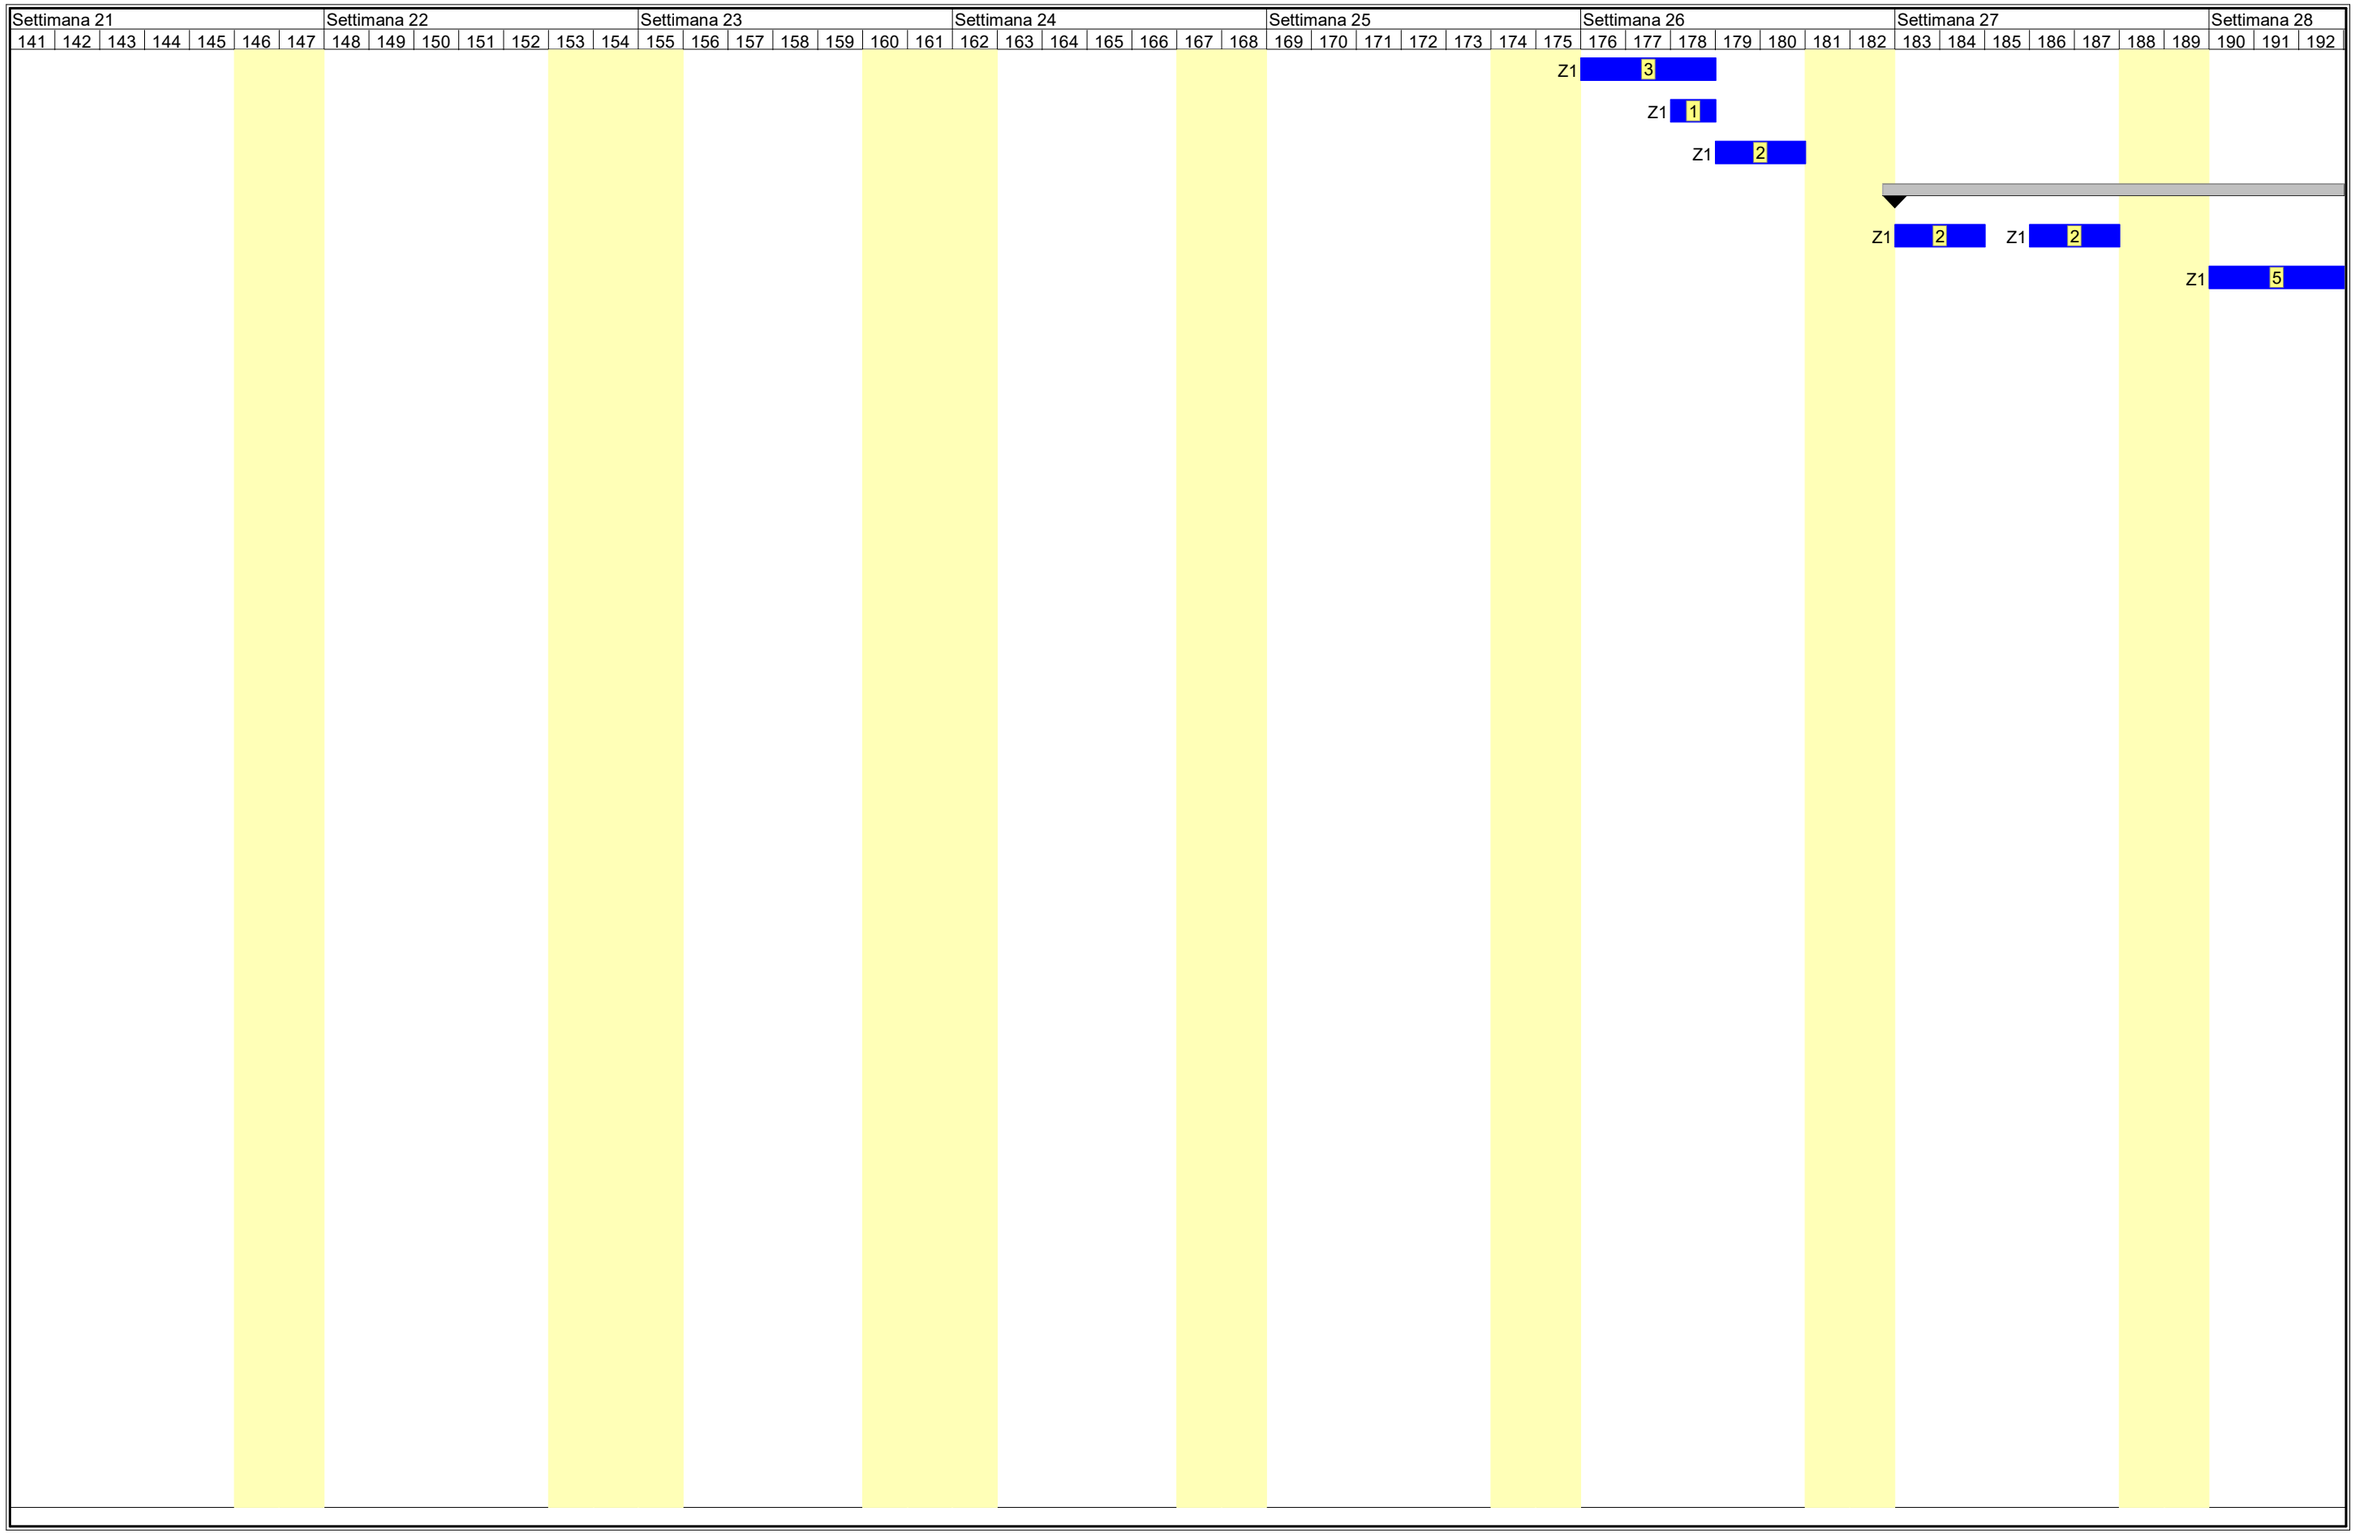
Settimana 21
Settimana 22
Settimana 23
Settimana 24
Settimana 25
Settimana 26
Settimana 27
Settimana 28
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
Z1 3
Z1 1
Z1 2
Z1 2
Z1 2
Z1 5

				Settimana 29							Settimana 30							Settimana 31							Settimana 32							Settimana 33							Settimana 34							Settimana 35						
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244

				Settimana 29							Settimana 30							Settimana 31							Settimana 32							Settimana 33							Settimana 34							Settimana 35					
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244

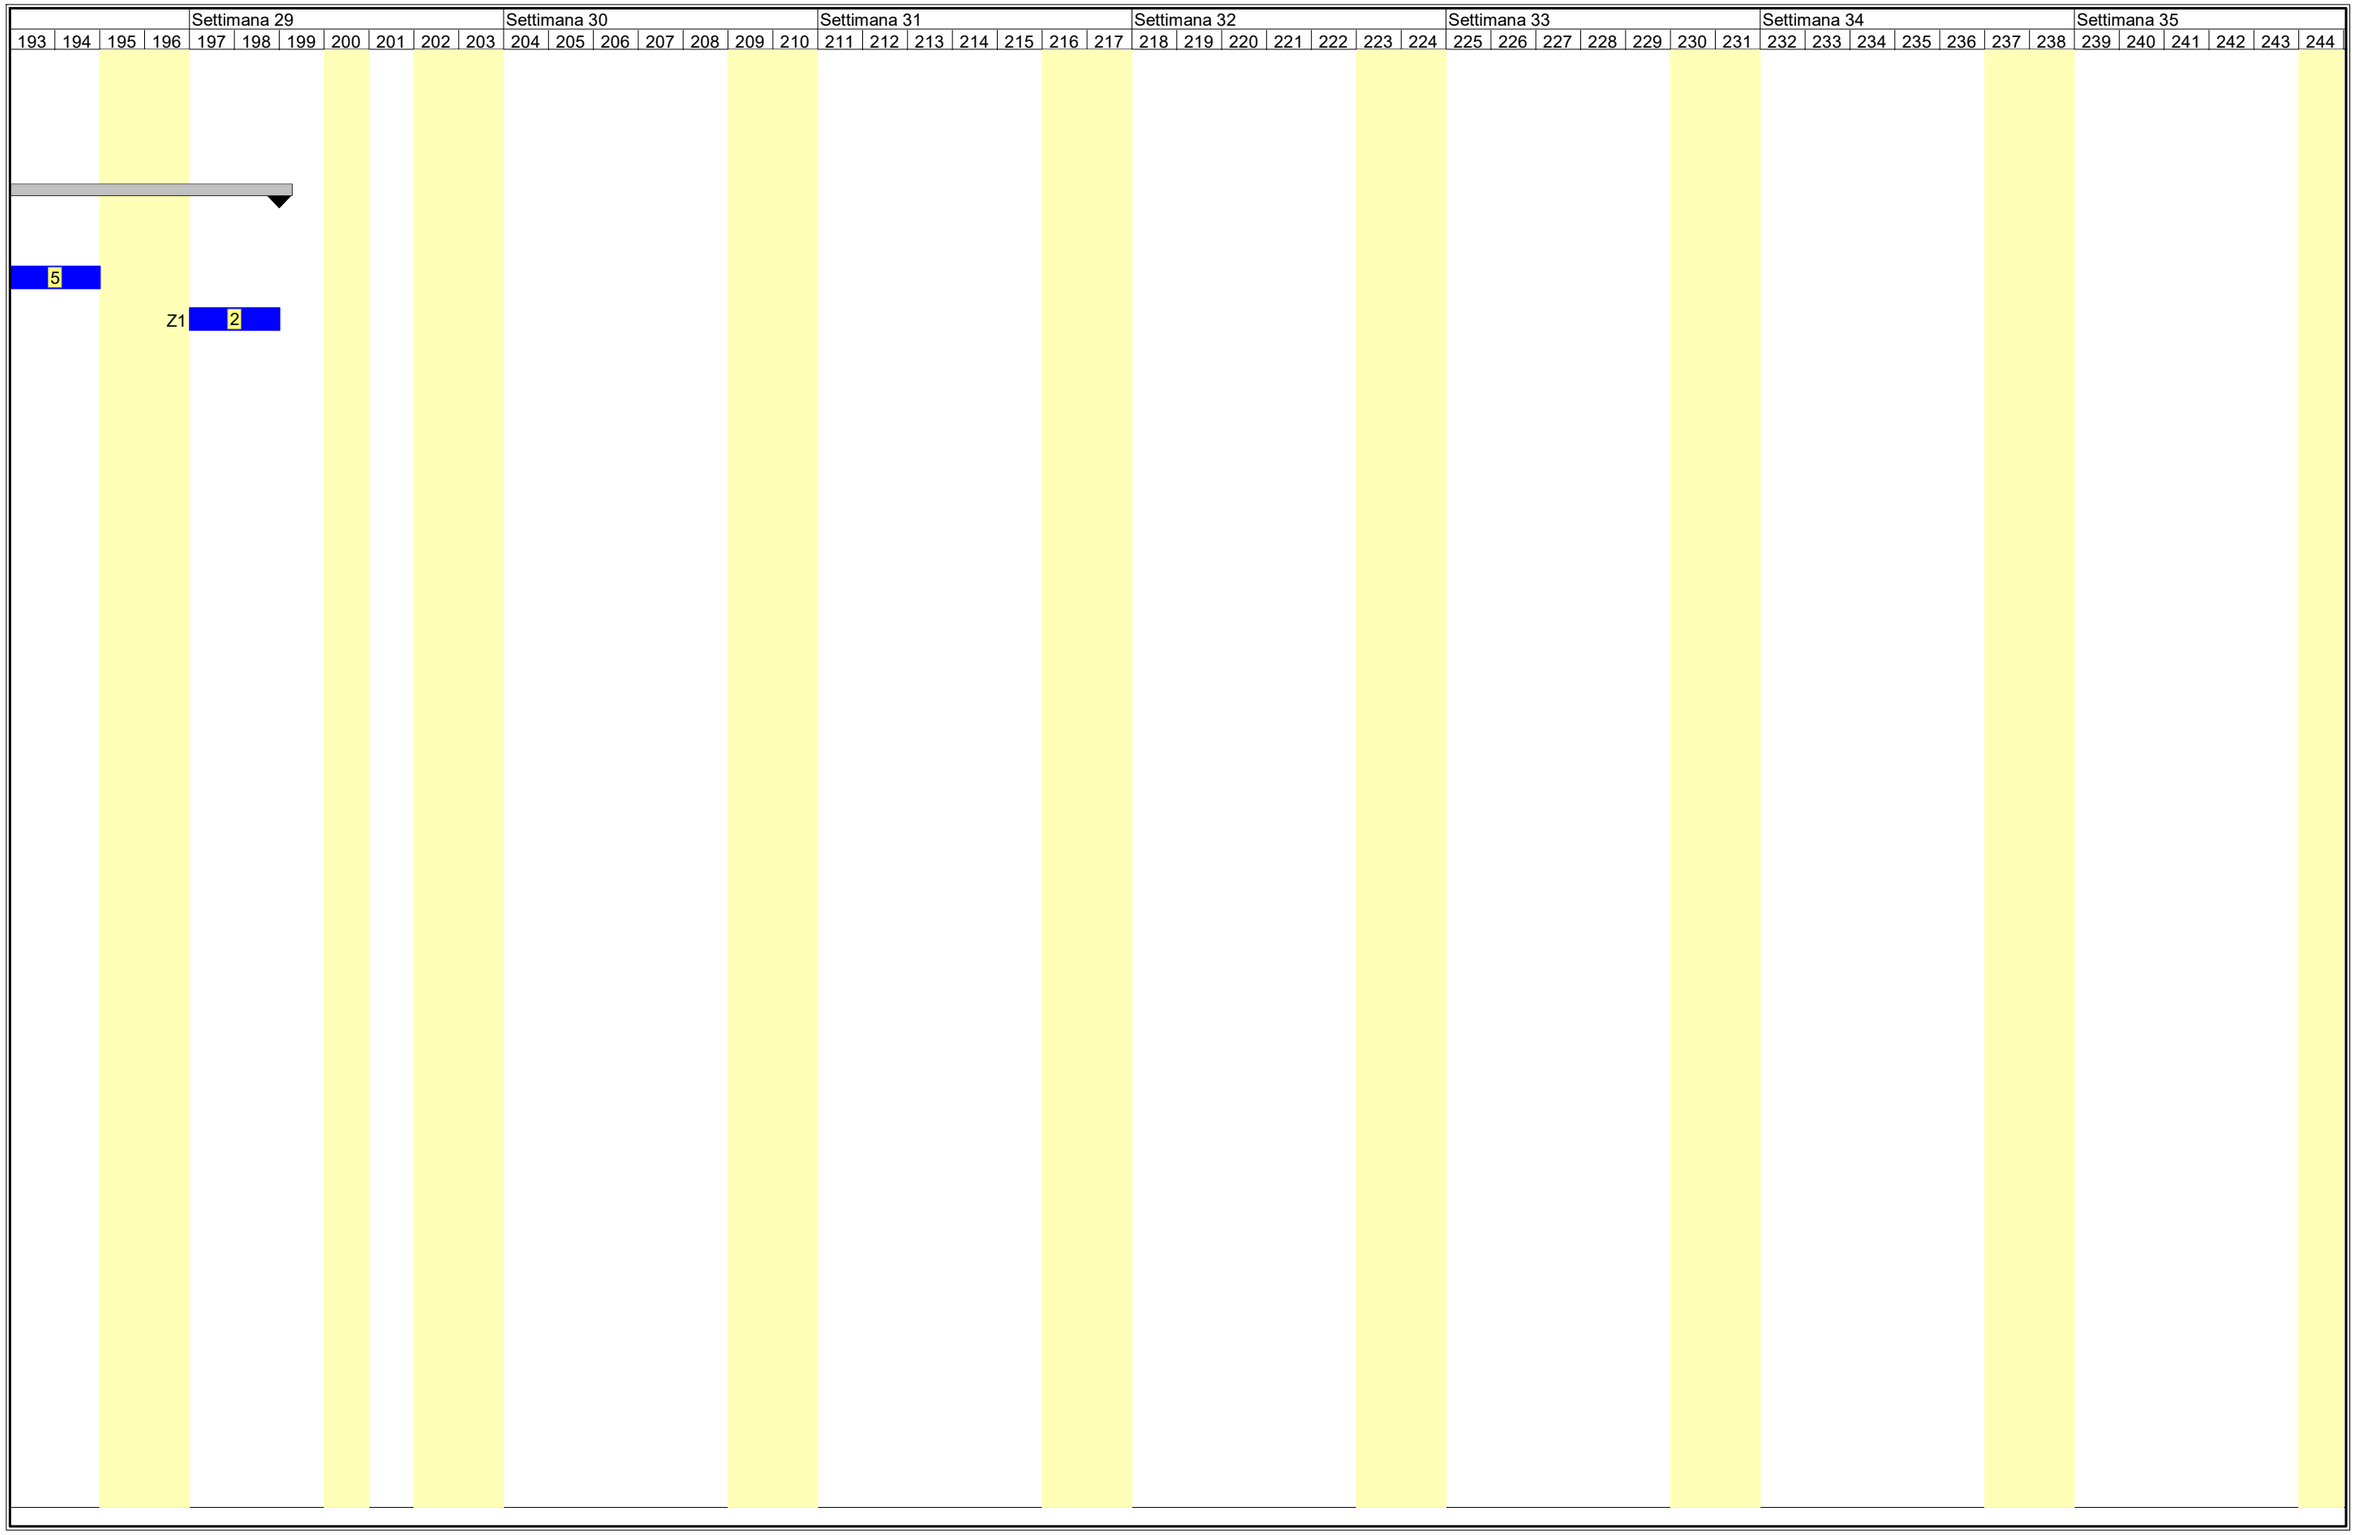
Settimana 29
Settimana 30
Settimana 31
Settimana 32
Settimana 33
Settimana 34
Settimana 35
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
5
Z1
2
